



# ДОКЛАД О РАБОТЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

**Выполнение поручений Протокола совещания  
у генерального директора № 5 от 10.03.2022  
по ГП ОПК «Море-2», «Море-3» и «Море-4»**


**ГП ОПК «Море-2»**



# Общая организация работ по ГП ОПК

Приказом генерального директора №35 от 21.02.2022 руководителем инвестиционных мероприятий по ГП ОПК «Море-2», «Море-3» и «Море-4» назначен заместитель генерального директора по специальным программам Н.Д. Карачун.

В рамках реализации приказа была организована подготовка материалов к совещанию у генерального директора по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках государственных и федеральных программ.



PS: 01.03.2022  
комиссия  
мне

24.02.22  
03324



**10.03.2022** проведено совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов. **14.03.2022** генеральным директором утвержден протокол №5 совещания, в котором по проектам «Море-2» и «Море-3» даны поручения:

- поддержать предложения Карачуна Н.Д. о формировании рабочей группы;
- предоставить и доложить **31.03.2022** промежуточные результаты работы рабочей группы по завершению проекта.

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»  
А.В. Лобанов  
« 14/03 » 2022 г.

10.03.2022 г

**ПРОТОКОЛ № 5**

совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках государственных и федеральных программ

Место и время проведения: г. Москва, ул. Вольная, д. 30, малый конференц-зал, 15:00ч.

**Присутствовали:**

Генеральный директор	А.В. Лобанов
Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и электромеханике	А. П. Сарычев
Заместитель генерального директора по качеству и надежности	Р. Н. Барбул
Заместитель генерального директора по экономике	А.А. Белов
Заместитель генерального директора по безопасности	В.В. Валько
Заместитель генерального директора по научной работе	В. Я. Геча
Советник генерального директора	И.А. Корнеев
Главный инженер	П.А. Солопов
Заместитель генерального директора по специальным программам	Н.Д. Карачун
Начальник НПК по специальным программам	Д. Ю. Макарихин
Заместитель начальника НПК по специальным программам	А. А. Сухинин
Начальник СЭБ	К.В. Пицулин
Начальник службы по инвестиционным программам и бизнес-планированию	А.М. Каштан
Начальник отдела 34	В. В. Каверин
Заместитель главного инженера	Р.Х. Тайрякбиров
Главный специалист службы главного инженера	А.Е. Малинин

Слушали доклад заместителя генерального директора по специальным программам Карачуна Н.Д. по проекту «Море-2»:

1. Срок реализации данного проекта был 2014-2018 год. Общая производственная программа 129 единиц изделий. Выручка 2,7 млрд руб.
2. В настоящий момент проводится работа по корректировке проекта с целью приведения в соответствие объемов и сроков программы возможностям и потребностям предприятия. Выход откорректированного проекта из ГлавГосэкспертизы – май 2022 г.
3. Проект должен быть завершён в этом году.



Акционерное общество  
«Научно-производственная корпорация «Космические  
системы мониторинга, информационно-управляющие  
и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»  
(АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2022

Москва

Об определении ответственных по обеспечению эффективного управления, реализации и контроля выполнения инвестиционных мероприятий с шифром «Море-2», «Море-3», «Море-4»

В целях обеспечения эффективного управления реализацией в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (далее – Общество) инвестиционных мероприятий с шифром «Море-2», «Море-3» и «Море-4» (далее – Мероприятия) и исполнения приказа генерального директора от 21.02.2022 № 35:

1. В рамках управления содержанием и ходом реализации Мероприятий сформировать рабочую группу в составе:

Руководитель рабочей группы:	заместитель генерального директора по специальным программам	Карачун Николай Дмитриевич.
Заместители руководителя рабочей группы:	начальник НПК по специальным программам	Макарыкин Дмитрий Юрьевич;
	директор по насосному оборудованию	Думнов Владимир Николаевич.
Члены рабочей группы:	начальник отдела 45	Афромеев Евгений Владимирович;
	заместитель начальника НПК по производству, начальник цеха № 701	Белев Виктор Васильевич;
	заместитель начальника отдела 18	Белобородов Алексей Алексеевич
	заместитель начальника цеха № 700	Васильев Алексей Александрович;
	начальник лаборатории отдела 94	Воробьев Павел Викторович;

начальник службы по инвестиционным программам и бизнес-планированию

Каштан Андрей Михайлович;

директор обеспечения выполнения работ по государственному оборонному заказу по электромеханике

Квач Андрей Николаевич;

заместитель начальника цеха № 711

Кузьмин Владимир Вячеславович;

начальник финансово-договорного отдела 74

Лоснова Оксана Ивановна;

начальник участка цеха № 711

Лобач Андрей Андреевич;

главный специалист отдела 50

Малинин Анатолий Евгеньевич;

руководитель департамента методологии и организации закупочной деятельности

Соломанов Александр Петрович;

заместитель начальника НПК по специальным программам, отдел 15

Сухинин Андрей Александрович;

начальник лаборатории отдела 94

Тымаков Сергей Александрович;

начальник отдела 47

Тяпкин Владимир Викторович;

заместитель начальника отдела 40

Фомин Олег Сергеевич;

заместитель начальника отдела 32

Фомичев Сергей Сергеевич;

начальник отдела 721

Щербатов Александр Николаевич;

начальник финансового отдела

Щеткин Юрий Юрьевич.

2. Членам рабочей группы обеспечить разработку, актуализацию и утверждение документации по Мероприятиям: технических заданий, обосновывающей документации, проектно-сметной документации, планов-графиков проведения работ, бюджета, сведений и др. – по закрепленным направлениям работ.

3. Руководителю рабочей группы: разработать план работы рабочей группы;

определить функциональные обязанности и закрепить направления работ членов рабочей группы; обеспечить организацию и контроль исполнения работ, предоставление отчета о ходе реализации Мероприятий.

4. Заместителем генерального директора по направлениям деятельности и руководителям профильных подразделений Общества обеспечить административную и иную необходимую поддержку реализации Мероприятий в части управления содержанием, сроками реализации, стоимостью, качеством, рисками и другими ограниченными Мероприятий.

5. Контроль за исполнением работ в части касающейся производственного комплекса возложить на директора производства Высочина А.А.

6. Контроль за исполнением работ в части касающейся направления космической и комплексной силовой электромеханики возложить на заместителя генерального директора по космической и комплексной силовой электромеханике Абулгалимова А.С.

7. Контроль за исполнением работ в части касающейся электрооборудования и систем управления для АЭС возложить на и.о. заместителя генерального директора по электрооборудованию и системам управления для АЭС Петрова А.В.

8. Контроль за исполнением работ в части касающейся направления по космическим комплексам возложить на заместителя генерального директора по космическим комплексам Горбунова А.В.

9. Контроль за исполнением работ в части касающейся оборудования подразделений по качеству и надежности возложить на заместителя генерального директора по качеству и надежности Барбула Р.Н.

10. Контроль за исполнением работ в части касающейся оборудования подразделений службы главного технолога возложить на главного технолога Жарникова В.А.

11. Контроль за исполнением строительного-монтажных работ в части касающейся возложить на главного инженера Солопова П.А.

12. Контроль за финансово-экономическим обеспечением Мероприятий возложить на заместителя генерального директора по экономике Белова А.А.

13. Контроль за исполнением распоряжений возложить на заместителя генерального директора по специальным программам Карачуна Н.Д.

Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике и электромеханике

А.П. Сарычев

Сухинин А.А.  
(495) 266-54-91

**17.03.2022 оформлено распоряжение об определении ответственных по обеспечению эффективного управления, реализации и контроля выполнения инвестиционных мероприятий «Море-2», «Море-3» и «Море-4».**

**Распоряжением сформирован состав рабочей группы и определено направление работы. На заместителей генерального директора по направлениям возложен контроль за реализацией, в части касающейся.**






14.03.2022 утвержден план работы рабочей группы по ГП ОПК «Море-2», «Море-3» и «Море-4». Проведено совещание рабочей группы с распределением направлений работ и закреплением ответственных по направлениям.

Определен порядок работы рабочей группы по осмотру, инвентаризации, определению облика завершения строительства зданий и помещений.

СОГЛАСОВАНО  
Советник генерального директора  
  
И.А. Корнеев  
« 15 » марта 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель генерального  
директора по атомной энергетике  
и электромеханике  
  
А.П. Сарычев  
«    »    2022 г.

**План работы рабочей группы  
по ГП ОПК «Море-2», «Море-3» и проекту ГП ОПК «Море-4»**

№ п/п	Содержание работ	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объекты/Примечания
1	Проведение организационного совещания рабочей группы с распределением направлений работ по каждому из мероприятий и закреплением ответственных по направлениям	Карачун Н.Д.	14.03.2022	
2	Формирование плана работы рабочей группы на март 2022 г.	Карачун Н.Д.	14.03.2022	
3	Оформление распоряжения о формировании рабочей группы	Сухинин А.А	17.03.2022	
<b>«Море-2», «Море-3»</b>				
4	Анализ выполненных мероприятий инвестиционных программ и инвентаризация по объектам и подразделениям функциональных направлений с отражением: - объема выполненных и остающихся работ; - объема поставленного (введенного/не введенного в эксплуатацию) и недопоставленного оборудования. В случае наличия в проектах импортного оборудования оценка имеющихся рисков.	Афромеев Е.В. Беляев В.В. Васильев А.А. Воробьев П.В. Тимаков С.А. Иванов К.А. Кузьмин В.В. Фомин О.С. Фомичев С.С. Малинин А.Е. Щербаков А.Н.	до 24.03.2022	Отдел № 45 Цех № 701 Цех № 700 Отдел № 94 Отдел № 94 Отдел № 4 Цех № 711 Отдел № 40 Отдел № 32 СГИ СГИ
5	Заслушивание докладов по результатам анализа выполненных мероприятий на совещании рабочей группы	Карачун Н.Д.	29.03.2022	
6	Доклад генеральному директору об организации работы рабочей группы и промежуточных результатах	Карачун Н.Д.	31.03.2022	
7	Оформление утвержденных ЗГД по направлению деятельности актов инвентаризации с предложениями по достижению заложенных в инвестиционных мероприятиях целей и задач. Представление актов руководителю рабочей группы.	Члены рабочей группы	01.04.2022	
8	Анализ актов инвентаризации и предложений по завершению проектов с учетом требующегося и имеющегося финансирования. Заключение по актам	Карачун Н.Д. Солопов П.А. Белов А.А. Абдурагимов А.С. Барбул Р.Н. Жаринов В.А. Высочин А.А. Петров А.В. Горбунов А.В.	08.04.2022	



# ГП ОПК «Море-2»

15 – 16.03.2022 в рамках работы рабочей группы по ГП ОПК «Море-2» по утвержденному плану был произведен осмотр объектов строительства, целью которого было:

1. Уточнение объема выполненных и остающихся работ у подразделений-заказчиков.

2. Уточнение объема поставленного и недопоставленного оборудования.

По результатам осмотра оформлен протокол № 1. Членам рабочей группы даны указания на заполнение по установленной форме сведений о фактическом объеме реализованных мероприятий.

На основании заполненных форм подготовлен предварительный доклад о реализации

## ПРОТОКОЛ работы рабочей группы по ИП ГП ОПК РиТП «МОРЕ-2»

15-16.03.2022 г. г. Москва № 1

Место проведения: ул. Вольная, д. 30, стр. 4, 20, 11

### Участники:

Заместитель генерального директора по специальным программам	Н.Д. Карачун
Начальник НПК по специальным программам	Д.Ю. Макарихин
Заместитель начальника НПК по специальным программам	А.А. Сухинин
Заместитель главного инженера	Р.Х. Тайрякбиров
Начальник 721 отдела	А.Н. Щербаков
Начальник 74 службы	А.М. Каштан
Ведущий специалист 74 службы	Н.П. Гордеева
Начальник НПЦ КЭ	К.А. Иванов
Начальник 701 цеха	В.В. Беляев
Директор производства	А.А. Высочин
Заместитель начальника 700 цеха	А.А. Васильев
Начальник 711 цеха	К.В. Ижмяков
Начальник 40 отдела	М.В. Жаркова
Начальник 45 отдела	Е.В. Афромеев
Начальник лаборатории 452	И.Н. Хиблин
Начальник лаборатории СГТ	П.В. Воробьев

### Задачи:

1. Уточнение объема выполненных и остающихся работ у подразделений-заказчиков.
2. Уточнение объема поставленного (введенного/не введенного в эксплуатацию) и недопоставленного оборудования.

1. Рабочей группой осмотрены объекты капитального строительства по проекту ГП ОПК РиТП шифр «Море-2»: строения 4, 20, 11. Результаты осмотра прилагаются к настоящему протоколу (приложение 1).

2. По результатам осмотра руководителем проекта ГП ОПК РиТП шифр «Море-2» Н.Д. Карачуну выданы следующие поручения:

№ п/п	Поручения	Ответственный исполнитель	Срок доклада
1	Проработать перечень работ, запланированных в соответствии с договором подряда с АО «СтройСКР» № 50/195с от 2016 года. Доложить факт выполненных работ, закупленного оборудования на 01.03.2022 по каждому заказчику (подразделению). Доложить перечень невыполненных работ (оборудования) и причины их не исполнения.	Р.Х. Тайрякбиров А.Н. Щербаков	18.03.2022



## КОРПУС № 4

# Объекты строительства по структурным подразделениям

Технический заказчик	Структурная принадлежность подразделения	Объект проведения работ и установки закупаемого оборудования
Цех № 700	Директор производства А. А. Высочин	Участок подготовки алюминиевых деталей под сварку
Цех № 701	И.о. ЗГД по ЭО и СУ для АЭС А.В. Петров	Столярно-упаковочное производство



**Объект строительства:** Корпус 4, 1 этаж 2-х этажной части, Участок подготовки  
алюминиевых деталей под сварку

**Технический заказчик:** Цех № 700

**Структурная принадлежность:** Директор по производству А.А. Высочин



### **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:**

Работы по объекту строительства **ПРОВЕДЕНЫ В 2017 ГОДУ.**

Готовность по СМР - 93%

Всего технологического оборудования в проекте **18 ед.**, из них перемещаемое – 11 ед., существующее – 7 ед., приобретаемое – 0 ед.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:**

Обеспечить надлежащее обращение с технологическими опасными жидкостями и поддержание помещения в функционально пригодном состоянии. Произвести монтаж инженерного оборудования\*.

**Работы по объекту не проводить.**

Требуемое финансирование\*\* - 3,6 млн. руб.

\* Инженерное оборудование здесь и далее по тексту включает предусмотренные проектом электро-, водо- и теплоснабжение, канализацию, а также пожарную и охранную сигнализацию

\*\* Требуемое финансирование здесь и далее по тексту приведено ориентировочно





**Объект строительства:** Корпус 4 Столярно-упаковочное производство  
**Технический заказчик:** Цех № 701  
**Структурная принадлежность:** И.о. ЗГД по ЭО и СУ для АЭС А.В. Петров



### **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:**

Работы по объекту строительства **ПРОВЕДЕНЫ В 2017-2018 ГОДАХ (НЕ ЗАВЕРШЕНЫ).**

Готовность по СМР - 48% (заменена кровля 3-х эт. части, усилен фундамент, восстановлена несущая способность перекрытий, заменены окна и двери, частично смонтирована приточно-вытяжная вентиляция, завершены работы в помещениях ИТР, кладовых и на лестничном пролете 3-х этажной части)

Кровля 2-х этажной части корпуса **В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ** (решение по замене кровли в находится на проверке в Госэкспертизе)

Всего технологического оборудования в проекте **46 ед.**, из них приобретаемое – 2 ед. (приобретено – 1), перемещаемое – 7 ед., существующее – 37 ед.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:**

Выполнить ремонт кровли, второй лестницы, внутренние перегородки, стяжку пола на 2 этаже, завершить монтаж вентиляции, произвести косметический ремонт производственных помещений на 1 и 2 этаже, смонтировать рейсмусовый станок, расставить оборудование. Произвести монтаж инженерного оборудования.

**Другие работы по объекту не производить.**

Требуемое финансирование – 44 млн. руб.



Технический заказчик	Структурная принадлежность подразделения	Объект проведения работ и установки закупаемого оборудования
Цех № 700	Директор производства А.А. Высочин	Механообрабатывающее производство
Цех № 711	ЗГД по КиКСЭ А.С. Абдурагимов	Участки: ПСИ-1, 2, вакуумных испытаний, подготовки испытаний, ресурсных испытаний, упаковочный, участок намагничивания роторов, изготовления сердечников, заливки и пропитки, климатических испытаний, сборки, чистой сборки, регулировки, балансировки, монтажный, хранения ЭРИ, входного контроля, кладовая приборов
Отдел № 52	Главный инженер П.А. Солопов	Архив конструкторского сектора главного инженера, конструкторский сектор службы главного инженера
Отдел № 94	Главный технолог В.А. Жаринов	Лаборатории: переработки полимерных деталей, электроизоляционных материалов, высокоэнергетических постоянных магнитов, механообработки, металловедения, участок приготовления, исследования, и входного контроля компаундов, лаков, клеев, конструкторский сектор разработки технологическое оснастки



**Объект строительства:**

Корпус 11, 2 этаж, Механообрабатывающее производство

**Технический заказчик:**

Цех № 700

**Структурная принадлежность:** Директор по производству А.А. Высочин



### **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:**

Работы по объекту строительства **НЕ ЗАВЕРШЕНЫ**. Помещения **ЗАХЛАМЛЕНЫ имуществом**.  
Готовность по СМР - 24% (в 2017 году завершены работы в пом. 204-208 (душевые, раздевалки), ремонт коридора на завершающей стадии, начат ремонт помещений 213, 214, 215, 216, 217).  
Всего технологического оборудования в проекте **63 ед.**, из них перемещаемое – 60 ед., существующее – 3 ед., приобретаемое – 0 ед.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:**

Завершить ремонт коридора и помещений 215, 216, 217, навести порядок в помещениях, рассортировать и выкинуть хлам, произвести расстановку оборудования. Произвести монтаж инженерного оборудования. **Другие работы по объекту не производить.**

Требуемое финансирование – 4,7 млн. руб.






Объект строительства: Корпус 11, 3 и 4 этаж, помещения участков, кладовая, цех точной электромеханики (пом. 304-314, 318, 403-420, 425)

Технический заказчик: Цех № 711

Структурная принадлежность: ЗГД по КикСЭ А.С. Абдурагимов

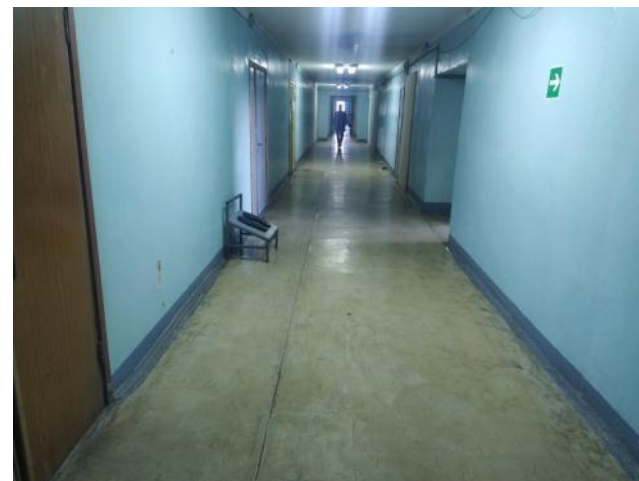

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства **ЧАСТИЧНО ПРОВОДЯТСЯ НА 4 ЭТАЖЕ.**

Готовность по СМР – 27% (завершены работы на участке хранения для ЭКБ (пом.416), завершается отделка в помещениях для хранения ЭРИ, материалов и комплектов (417, 418, 419), выполнено электроосвещение, установлены розетки, подготовлены стены и потолок к чистовой отделке на участке входного контроля (420) и части коридора, установлены двери, выполнен тамбур).

Всего технологического оборудования в проекте **591 ед.**, из них перемещаемое – 216 ед., существующее – 375 ед., приобретаемое – 0 ед.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Завершить ремонт помещений 417-420, произвести расстановку имеющегося оборудования. Произвести монтаж инженерного оборудования. **Другие работы по объекту не производить.**

Требуемое финансирование – 3,2 млн. руб.



Объект строительства: Корпус 11, 2 этаж – конструкторский сектор и архив  
Технический заказчик: Отдел № 52  
Структурная принадлежность: Главный инженер П.А. Солопов

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства **НЕ ЗАВЕРШЕНЫ.**

Готовность по СМР – 40% (в помещениях 218 и 220). Выполнены перегородки, установка дверей, стяжки пола, подготовка стен под окраску.

Всего технологического оборудования в проекте **47 ед.**, из них перемещаемое – 16 ед., существующее – 1 ед., приобретаемое – 30 ед. (приобретено – 0)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Завершить ремонт помещений 218 и 220, произвести перемещения имеющегося оборудования, АРМ и мебели. Произвести монтаж инженерного оборудования. **Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить.**

Требуемое финансирование – 1 млн. руб.





Объект строительства: Корпус 11, 5 этаж, лаборатории, участки, конструкторский сектор, архив

Технический заказчик: Отдел № 94

Структурная принадлежность: Главный технолог В.А, Жаринов



### **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:**

Работы по объекту строительства **ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ.**

Готовность по СМР – 93% (помещения 502-518, 520-530 отремонтированы, не подключены коммуникации, не расставлено оборудование)

Оборудование, ед. (по проекту – 35, приобретено – 35);

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:**

Подключить приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях, устранить протечки в кровле (пом. 509, 511, 527, 529), установить мойки с холодным и горячим водоснабжением в пом. 505, 529, произвести перемещения имеющегося оборудования, АРМ и мебели. Произвести монтаж инженерного оборудования. **Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить.**

Требуемое финансирование – 2 млн. руб.



Технический заказчик	Структурная принадлежность подразделения	Объект проведения работ и установки закупаемого оборудования
Отдел № 40	ЗГД по КиН Р.Н. Барбул	Метрологический центр
Отдел № 45		Измерительная лаборатория
Отдел № 32	ЗГД по КиКСЭ А.С. Абдурагимов	Сектор главного конструктора, лаборатория комплектных электроприводов и преобразователей частоты
Отдел № 4		Научно-производственный центр корабельного электромашиностроения, кабинеты подразделений, руководителей и сотрудников



Объект строительства: Корпус 20, 1 - 4 этажи, метеорологический центр, лаборатории, кабинеты ИТР, пом. 101,102,104-106,107-110,210,301-309,310Б,319-324,416-418.

Технический заказчик: Отдел № 40

Структурная принадлежность: ЗГД по КиН Р.Н. Барбул



### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства: **НА ЭТАПЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (НЕ ЗАВЕРШЕНЫ).**

Готовность по СМР - 45% (монтаж 2-х виброизолированных фундаментов, устройство стен и перегородок, закладка вентиляционных шахт, штукатурные работы, монтаж окон, дверей и ворот, прокладка внутренних систем отопления, вентиляции).

Всего технологического оборудования в проекте **324 ед.**, из них перемещаемое – 315 ед., существующее – 0 ед., приобретаемое – 9 ед. (приобретено – 9)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание законсервировать. Как вариант рассмотреть отделку помещений и размещение сотрудников ЗГД по космическим комплексам по отдельным ФЦП.


Требуемое финансирование – 38 млн. руб.



Объект строительства: Корпус 20, 1 этаж - пом. 103, вибростенд,  
2 этаж – пом. 201, пультовая вибростенда

Технический заказчик: Отдел № 45

Структурная принадлежность: ЗГД по КиН Р.Н. Барбул

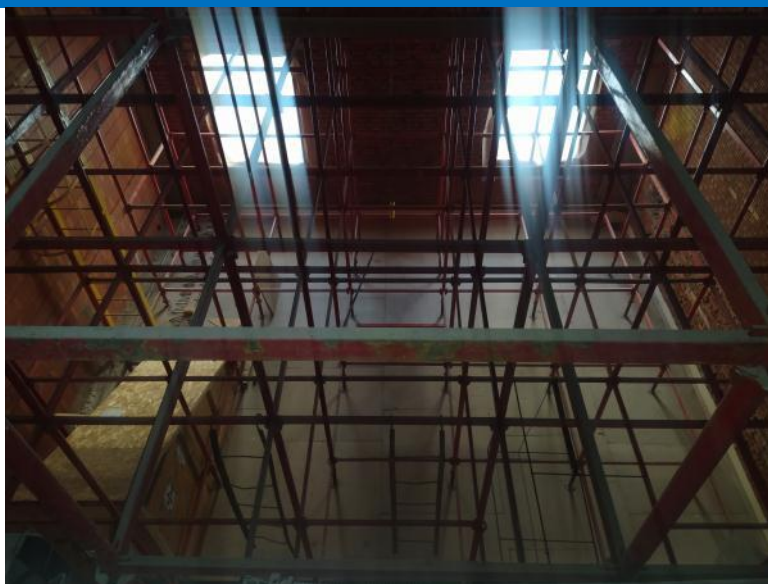

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства: **НА ЭТАПЕ МОНТАЖА СТЕНДА И ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.**

Готовность по СМР - 40% (установлены сейсмомасса на пневмоопоры с плитой, смонтирована часть технологической обвязки стенда, окна и ворота, прокладка внутренних систем отопления, вентиляции, водопровода и канализации, в цокольной части выполнена стяжка полов и чистовая отделка стен).

Всего технологического оборудования в проекте **2 ед.**, из них перемещаемое – 0 ед., существующее – 0 ед., приобретаемое – 2 ед. (приобретено – 2)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стенд законсервировать.

Как вариант рассмотреть отделку помещений и размещение сотрудников ЗГД по космическим комплексам по отдельным ФЦП.

Требуемое финансирование – 13,0 млн. руб.







Объект строительства: Корпус 20, пом. 401-406, сектор главного конструктора, лаборатория,

Технический заказчик: Отдел № 32

Структурная принадлежность: ЗГД по КикСЭ А.С. Абдурагимов

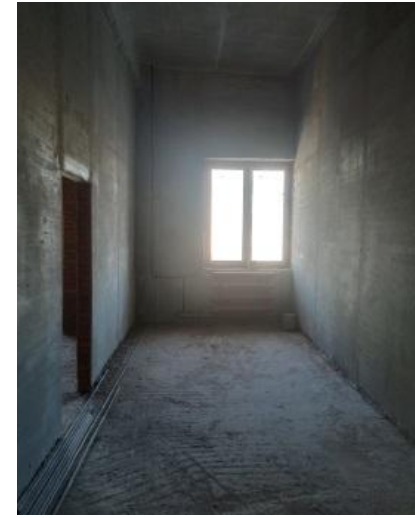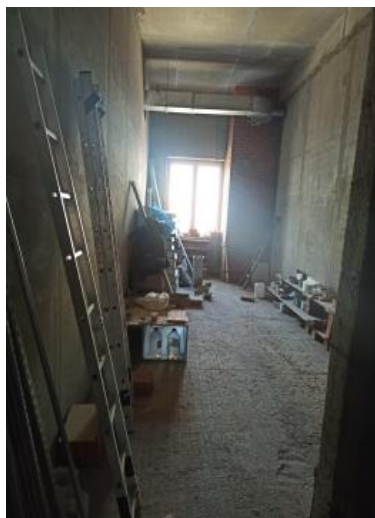

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства: **НА ЭТАПЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.**

Готовность по СМР - 40% (устройство стен и перегородок, закладка вентиляционных шахт, штукатурные работы, монтаж окон, дверей и ворот, прокладка внутренних систем отопления, вентиляции)

Всего технологического оборудования в проекте **58 ед.**, из них перемещаемое – 58 ед., существующее – 0 ед., приобретаемое – 0 ед.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стеллажи законсервировать.

Как вариант рассмотреть отделку помещений и размещение сотрудников ЗГД по космическим комплексам по отдельным ФЦП.

Требуемое финансирование – 10 млн. руб.





Объект строительства: Корпус 20, 5 этаж, пом. 501-504,510,514-516, помещения  
НПЦ КЭ  
Технический заказчик: Отдел № 4  
Структурная принадлежность: ЗГД по КикСЭ А.С. Абдурагимов



### РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

Работы по объекту строительства: **НА ЭТАПЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.**

Готовность по СМР - 30% (устройство стен и перегородок, закладка вентиляционных шахт, штукатурные работы, монтаж окон, дверей и ворот, прокладка внутренних систем отопления, вентиляции)

Всего технологического оборудования в проекте **32 ед.** (комплекты АРМ), из них перемещаемое – 32 ед., существующее – 0 ед., приобретаемое – 0 ед.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТ:

Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стенд законсервировать.

Как вариант рассмотреть отделку помещений и размещение сотрудников ЗГД по космическим комплексам по отдельным ФЦП.

Требуемое финансирование – 16 млн. руб.



# Предлагаемый перечень работ и требуемое финансирование для завершения ГП ОПК «Море-2»

Объект строительства	Технический заказчик	Структурная принадлежность подразделения	Предлагаемый перечень работ для завершения ГП ОПК	Требуемое финансирование, млн. руб.
Корпус № 4	Цех 700	Директор производства Высочин А.А.	Обеспечить надлежащее обращение с технологическими опасными жидкостями и поддержание помещения в функционально пригодном состоянии. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Работы по объекту не проводить</b>	3,6
	Цех 701	И.о.ЗГД по ЭО и СУ для АЭС Петров А.В.	Выполнить ремонт кровли, второй лестницы, стяжку пола на 2 этаже, завершить монтаж вентиляции, произвести косметический ремонт производственных помещений на 1 и 2 этаже, смонтировать рейсмусовый станок, расставить оборудование. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Другие работы по объекту не производить.</b>	44,0
Корпус № 11	Цех 700	Директор производства Высочин А.А.	Завершить ремонт коридора и помещений 215, 216, 217, навести порядок в помещениях, рассортировать и выкинуть хлам, произвести расстановку оборудования. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Другие работы по объекту не производить.</b>	4,7
	Цех 711	ЗГД по КиКСЭ Абдурагимов А.С.	Завершить ремонт помещений 417-420, произвести расстановку имеющегося оборудования. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Другие работы по объекту не производить.</b>	3,2
	Отдел 52	Главный инженер Солопов П.А.	Завершить ремонт помещений 218 и 220, произвести перемещения имеющегося оборудования, АРМ и мебели. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить.</b>	1,0
	Отдел 94	Главный технолог Жаринов В.А.	Подключить приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях, устранить протечки в кровле (пом. 509, 511, 527, 529), установить мойки с холодным и горячим водоснабжением в пом. 505, 529, произвести перемещения имеющегося оборудования, АРМ и мебели. Произвести монтаж инженерного оборудования. <b>Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить.</b>	2,4
Корпус № 20	Отдел 40	ЗГД по КиН Барбул Р.Н.	<b>Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание законсервировать.</b>	38,0
	Отдел 45		<b>Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стенд законсервировать.</b>	13,0
	Отдел 32	ЗГД по КиКСЭ Абдурагимов А.С.	<b>Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стенд законсервировать.</b>	10,0
	Отдел 04		<b>Работы прекратить. Закупку оборудования, АРМ и мебели не производить. Здание и стенд законсервировать.</b>	16,0
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>				<b>135,9</b>
