



Мониторинг проекта




ОБЩИЙ ГРАФИК ВЫДАЧИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)



Выдача КД завершена



ГРАФИК РАССЫЛКИ RFQ (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

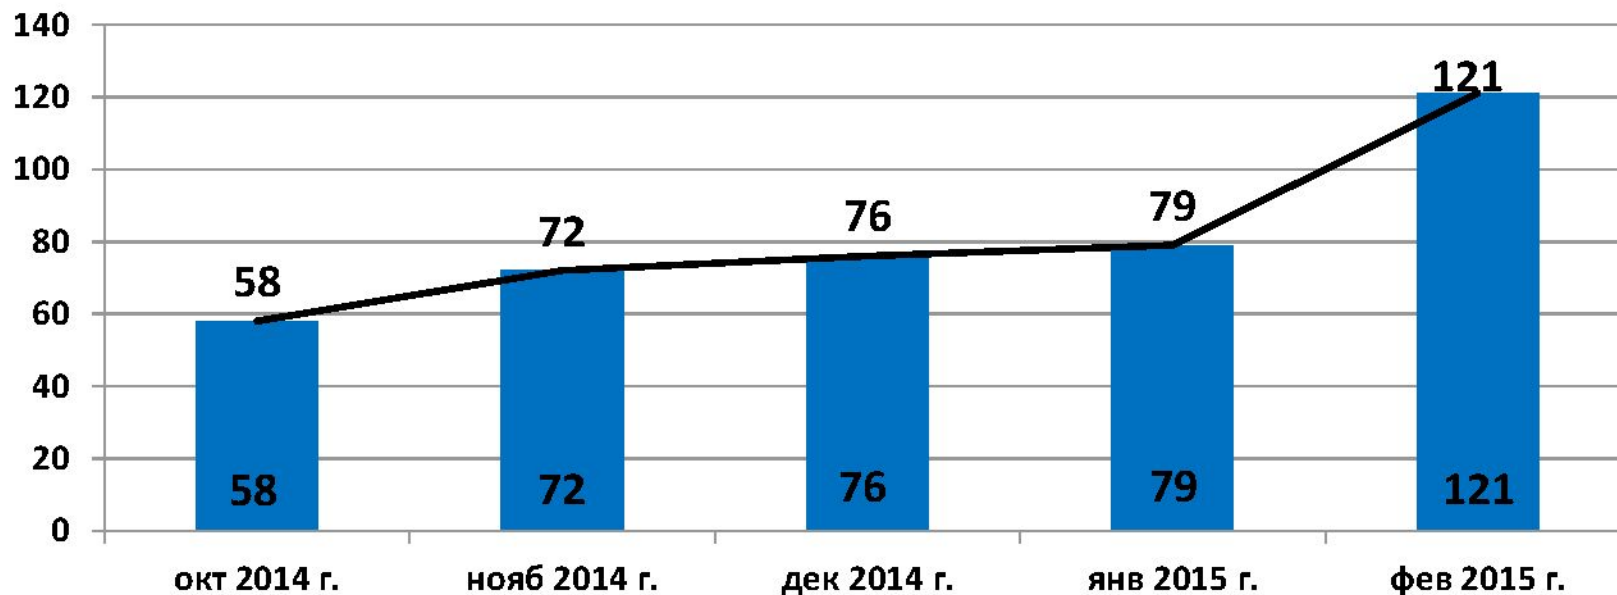


■ разослано RFQ

— планировалось разослать RFQ

Рассылка RFQ завершена.



ГРАФИК НОМИНАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

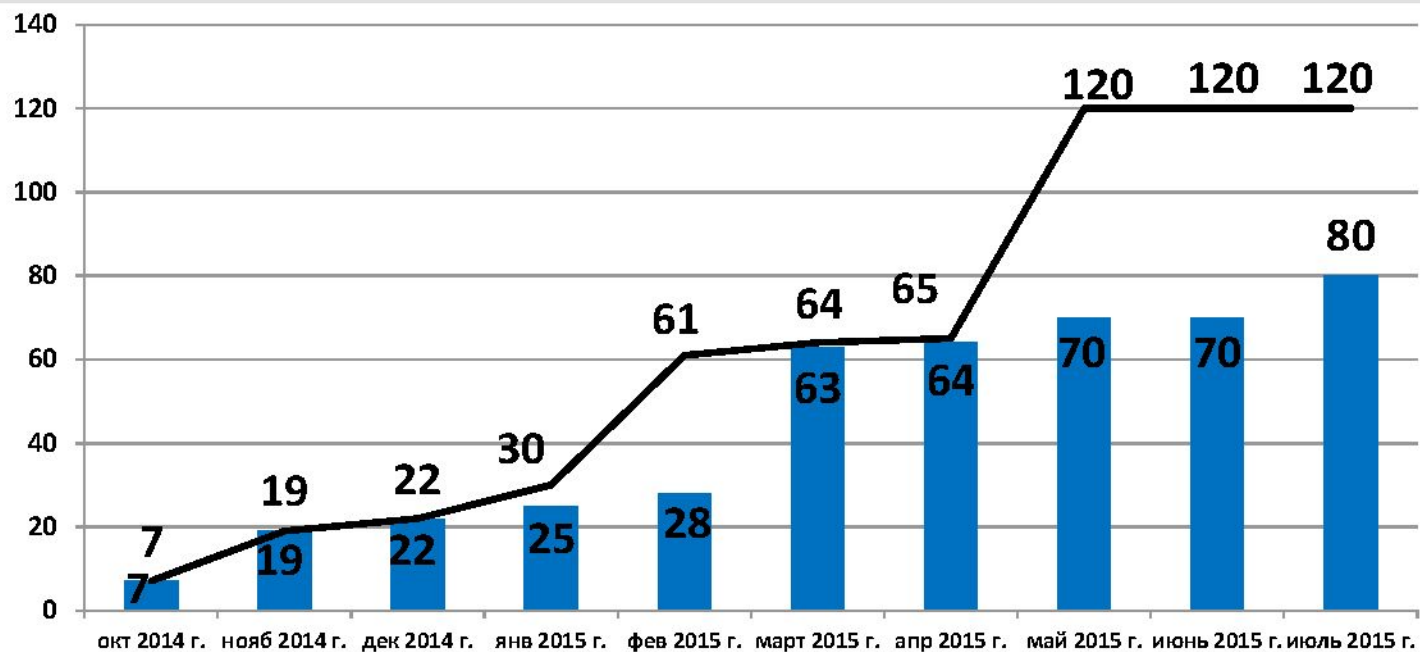

фактически номинировано

планировалось номинаций


Номинированы все поставщики комплектующих с длительным сроком освоения.



Комментарии по отклонениям




Бюджет платежей без НДС, тыс. руб.

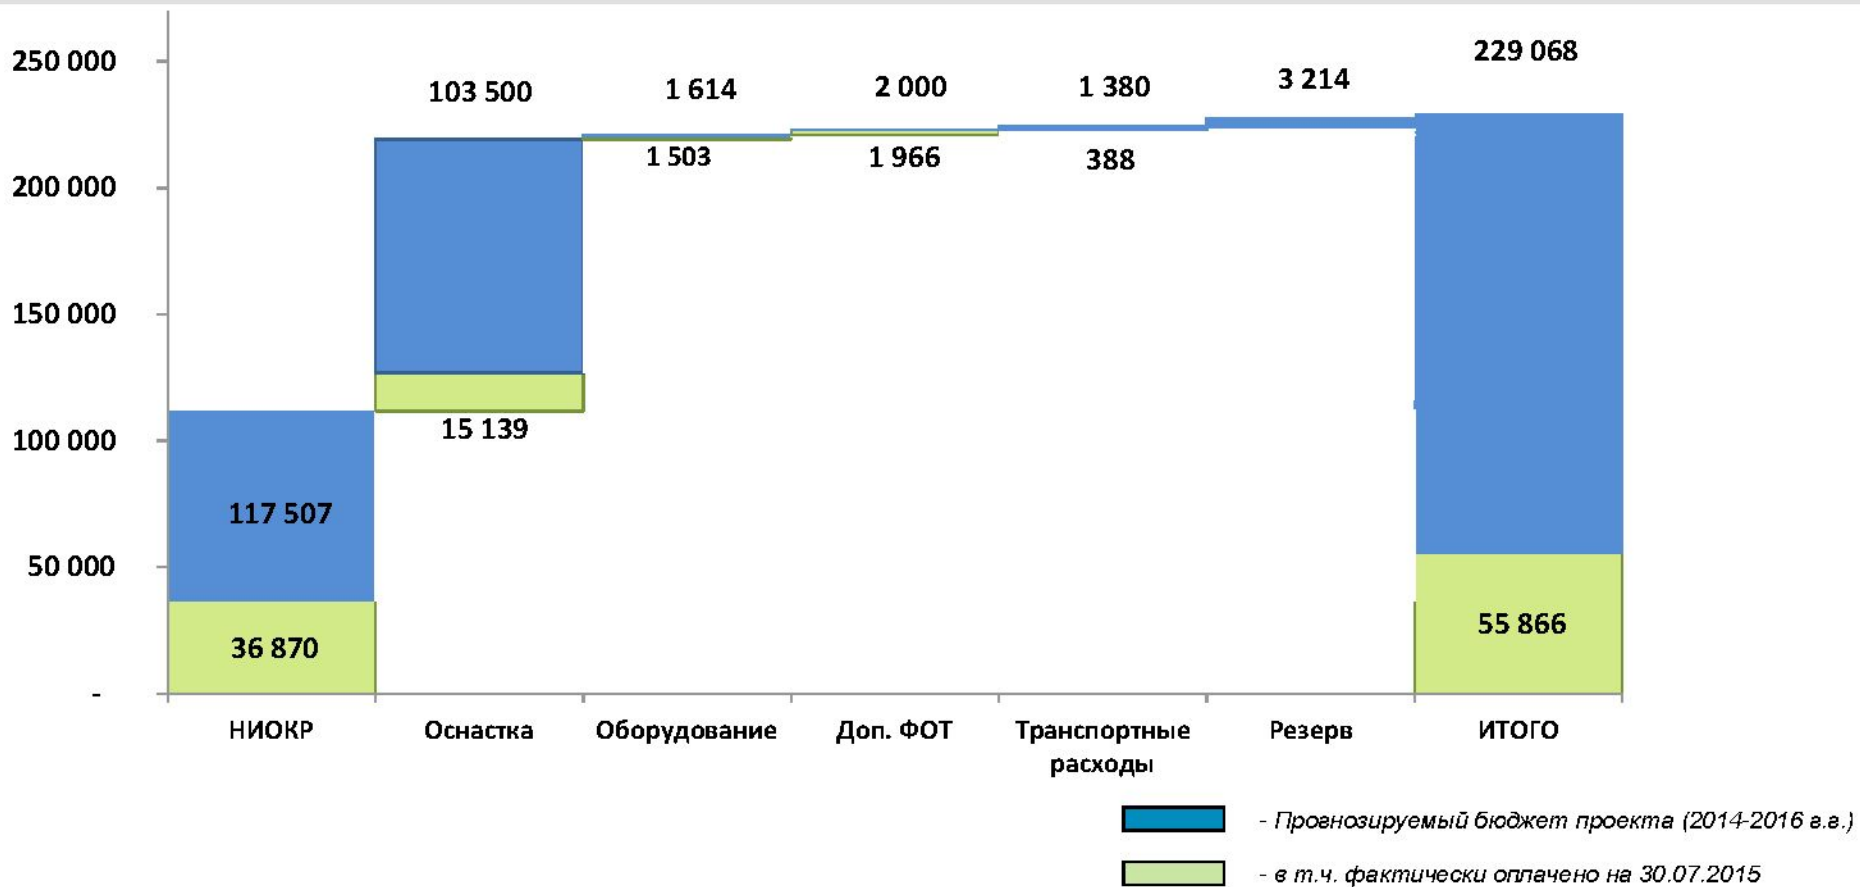



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ 1 ЭТАП SOP 1.09.2015г. мосты «Спайсер» и панель приборов с ЕКП


Проектирование

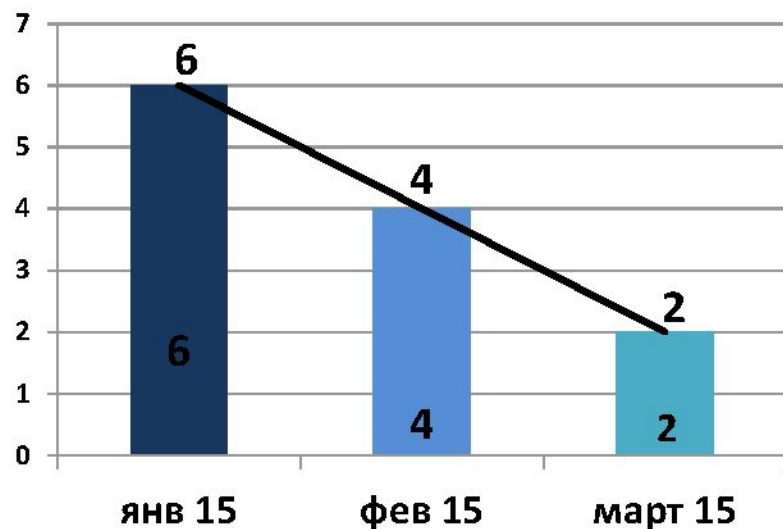

модернизация средний штамп
крупный штамп факт (общий)

	крупный штамп	средний штамп	модернизация
Итого, шт.	6	4	2

Изготовление

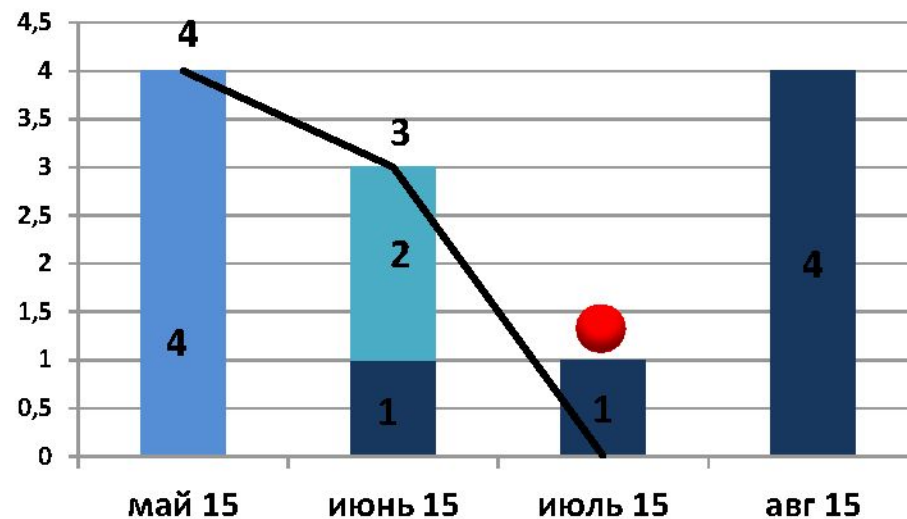


модернизация средний штамп
крупный штамп факт(общий)



Причина отклонения: неисправимый брак отливки штампа. С учетом сроков поставки новой отливки, на продуктовом комитете срок внедрения ЕКП перенесен на 01.01.2016 г. Отливка доставлена 20.08.2015 г.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНАСТКИ 2 ЭТАП СОР 1.01.2016 г.

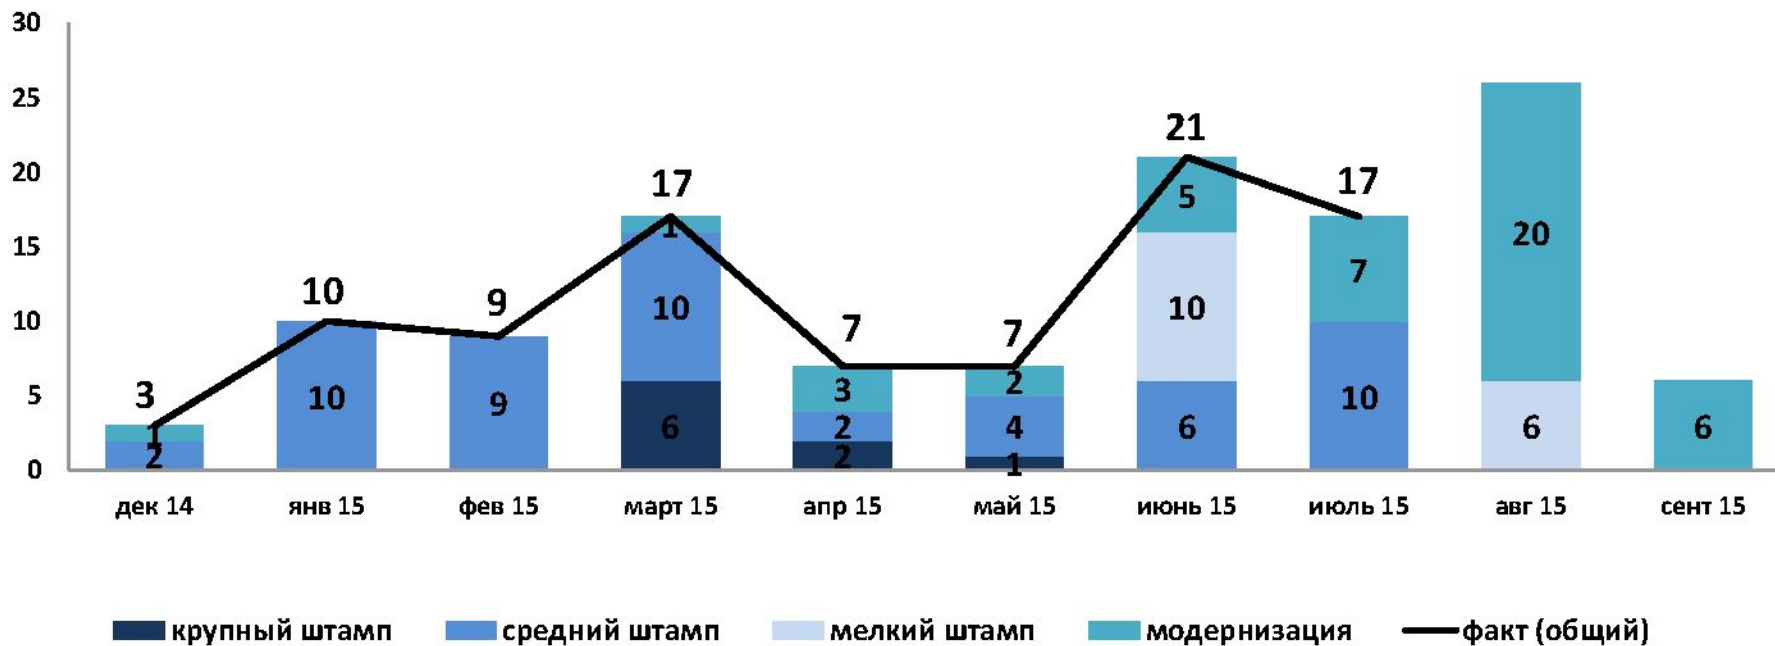

	крупный штамп	средний штамп	мелкий штамп	модернизация
Итого, шт.	9	53	16	45



ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ 2 ЭТАП SOP 1.01.2016 г.

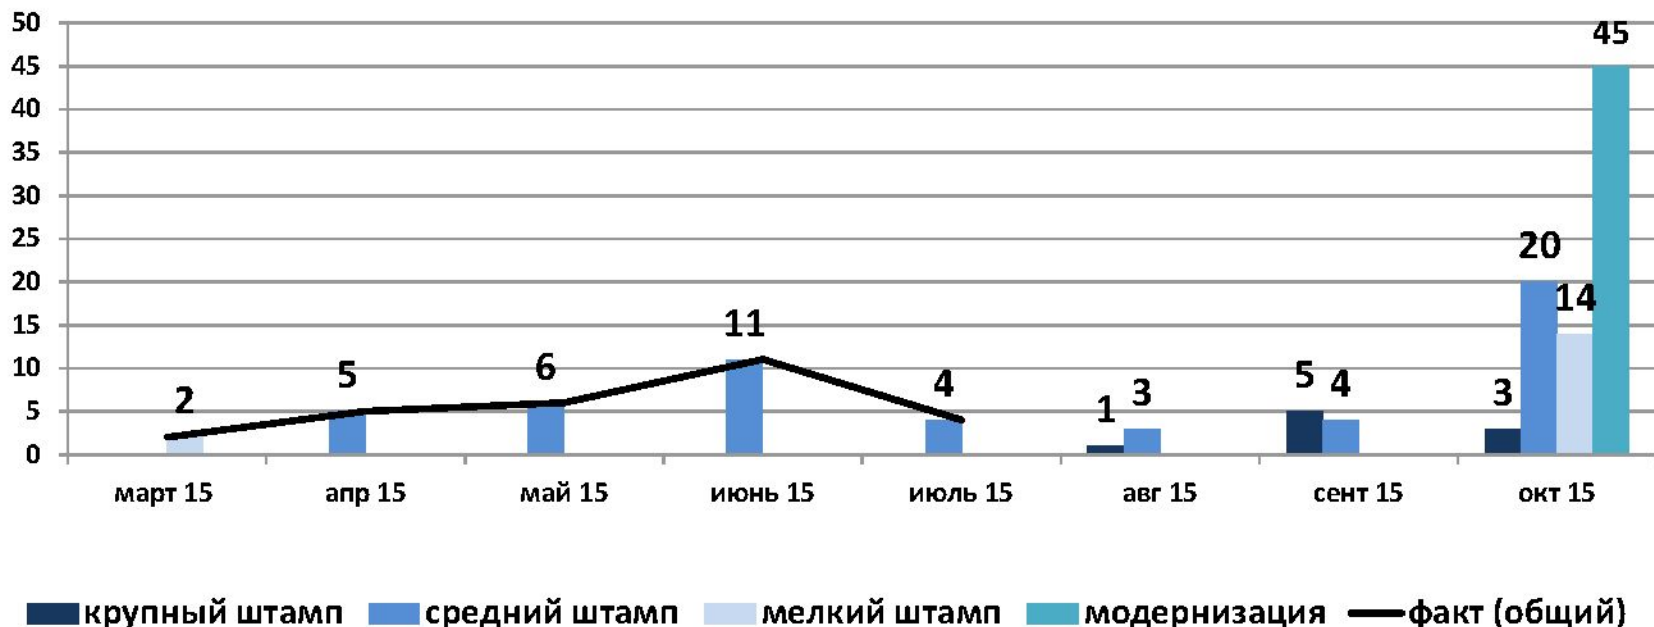

	крупный штамп	средний штамп	мелкий штамп	модернизация
Итого, шт.	9	53	16	45



ПРИЛОЖЕНИЯ



СИТУАЦИЯ ПО СРОКАМ НОМИНАЦИЙ (1/2)

Описание проблемы	Ответственное подразделение	Требуемые сроки	Пути решения
<p>Согласование PDS-листов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Длительный срок согласования PDS-листов по текущим проработкам. Отсутствие обратной связи от ДпЛ о ходе согласования.• Отсутствие стратегии перевода действующих поставщиков на обновлённую тару, предъявление ранее не заявленных требований к текущим тендерам.• Отсутствие обновлённого стандарта требований по таре.	ДТОиО ДпЛ	До формирования SSC	<ul style="list-style-type: none">• Специалистам ДпЗ передавать в ДТОиО копии утверждённых сорсинг-планов.• Специалистам ДТОиО разработать стратегию перевода поставщиков УАЗ на обновлённую тару в рамках договорной компании 2016.• Специалистам ДТОиО разработать и передать в ДпЗ обновлённый стандарт тары для проработки в новых проектах
<p>Согласование SSC с Соллерс-Москва:</p> <ul style="list-style-type: none">• Длительные сроки рассмотрения SSC службами Соллерс-Москва (в среднем около 10 дней) при отсутствии замечаний.	Соллерс-Москва	2 дня	<ul style="list-style-type: none">• Сокращение сроков рассмотрения номинационных документов.• Назначение замещающих согласующих лиц.



СИТУАЦИЯ ПО СРОКАМ НОМИНАЦИЙ (2/2)

Причины отклонений (40 позиций)





Спасибо за внимание!
