

первый.бит

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



на проект по внедрению финансового учета на платформе 1С предприятие на базе БИТ.Управление финансами государственного учреждения ПРОФ. 2.0

для Федеральное государственное бюджетное учреждение «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

11.08.2022 г.

данное коммерческое предложение
действительно до 01.11.2022г.

первыми – делают люди!

1bit.ru

ЭКСПЕРТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Более **20 лет** в IT-отрасли

100 офисов в **8** странах мира

Более **50** собственных IT-решений

Более **270 000** внедрений IT-систем

Техподдержка пользователей
24 часа **7** дней в неделю



8
стран

>100
офисов

>60
городов



Автоматизация бизнеса

- автоматизация всех видов учета
- управленческий учет
- отраслевая автоматизация
- автоматизация бизнес-процессов (ECM, CRM, HRM)
- комплексная автоматизация (ERP, BPM)



Инструменты для повышения эффективности

- BI-системы
- мобильные приложения
- облачные сервисы
- WEB-разработка

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



IT-услуги

- программное обеспечение
- IT-инфраструктура, телефония
- интеграция систем и оборудования
- AutoID
- защита информации
- мониторинг работоспособности и производительности

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Описание текущих проблем:

- Управленческий учет ведется в excel

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта:

- Настройка аналитического учета в БГУ 2.0
- Настройка учета по темам на базе ЗКГУ 3.0

Задачи проекта:

- Внедрение финансового учета на платформе 1С предприятие на базе БИТ.Управление финансами государственного учреждения ПРОФ. 2.0

Цель документа:

Предложение сотрудничества в рамках проекта по внедрению финансового учета на платформе 1С предприятие на базе БИТ.Управление финансами государственного учреждения ПРОФ. 2.0

Сроки и стоимость проекта

1. Сроки: 113 рабочих дней
2. Стоимость реализации проекта составляет: **2 973 000,00** рублей, без НДС
3. Срок действия коммерческого предложения **01.11.2022 г.**

Первый этап

Первым шагом взаимодействия мы видим проведения первого этапа – «**Моделирование**».

Цели первого этапа (Моделирование):


- Обследование и составление учетной схемы (совместно с Заказчиком), составление схемы взаимодействия отделов, согласования договоров, описание схемы обмена данными;
- Анализ нетиповых изменений в конфигурации Заказчика;
- Составление контрольного примера и демонстрация его Заказчику;
- Подготовка данных для актуализации ключевых справочников с учетом разработанной схемы учета (перечень статей затрат финансового учета, направлений деятельности, тем)

Результат Этапа:

- Схема взаимодействия отделов;
- Реестр функциональных разрывов;
- Готовая тестовая база на текущий период;

Сроки и стоимость этапа Моделирование :

1. Сроки
Срок реализации этапа **42** рабочих дней.
2. Стоимость реализации этапа составляет **728 000,00** рублей, без НДС

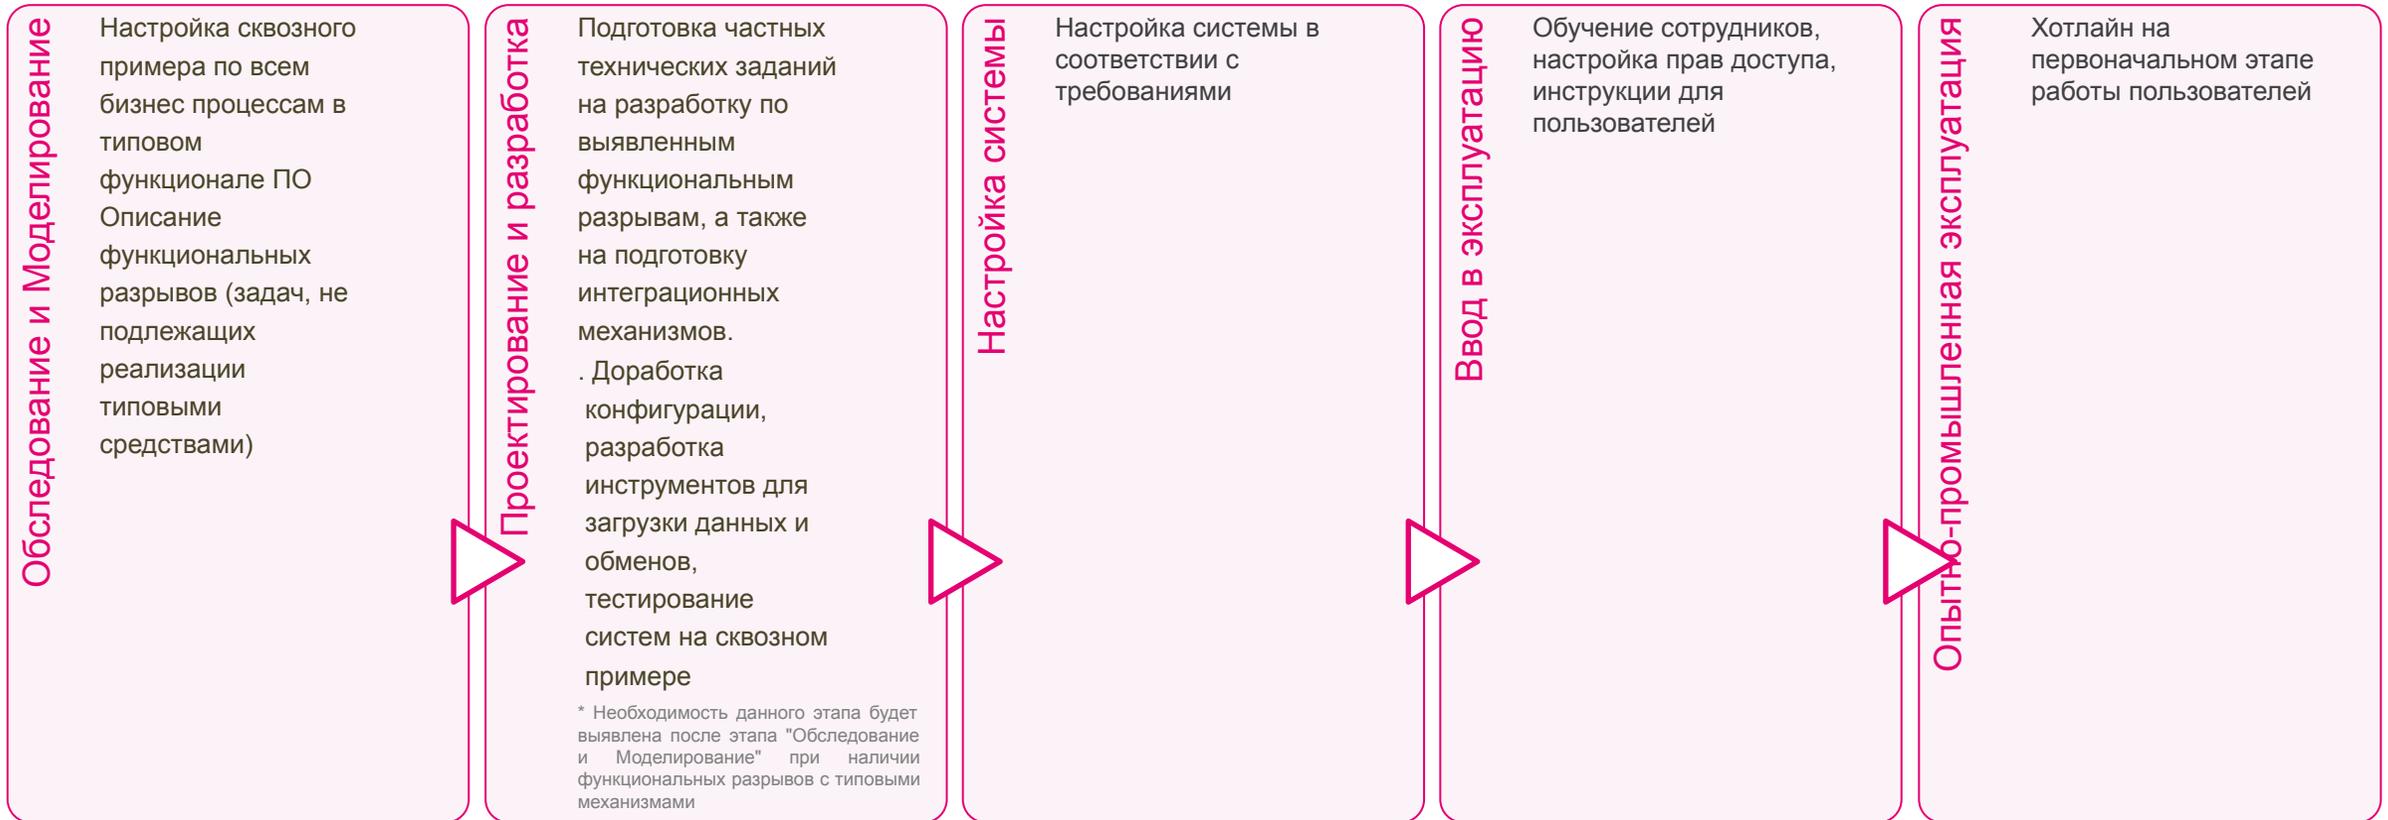

- Оплата ведется последовательно за каждый этап работ. Обязательным для начала сотрудничества является оплата первого этапа работ «Обследование и Моделирование».
- Подчеркнем, что в приведенном далее плане выполнения проекта оценки являются статистическими. Оценить сколько-нибудь достоверно весь комплекс работ на текущем этапе сотрудничества невозможно, можно говорить только о твердой стоимости этапа «Обследование и Моделирование».
- Мы придерживаемся открытой политики взаимодействия и далее приводим план выполнения проекта внедрения, показывающий, каким образом сложилась стоимость, а также готовы обсуждать Ваши пожелания по плану выполнения проекта (и, таким образом, стоимости).
- Трудоемкость и стоимость последующих этапов уточняется и в обязательном порядке согласовывается с Вами после выполнения первого этапа работ.

Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Примечание	Отчетный документ
ВНИИР, ФГБУ: Финансовый учет	113,5 дней	2 973 000,00р.		
1. Этап Моделирование бизнес-процессов (анализ функциональных разрывов)	42 дня	728 000,00р.	Список (ФИО) и количество сотрудников для проработки контрольных примеров	Реестр функциональных разрывов
2. Этап Проектирование (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	7,5 дней	112 000,00р.	Необходимость данного этапа будет выявлена после этапа "Моделирования" при наличии функциональных разрывов с типовыми механизмами	Согласованные Листы требований
3. Этап Разработка по листам требований (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	21 день	1 204 000,00р.	Необходимость данного этапа будет выявлена после этапов "Моделирование", "Проектирование"	Протоколы тестовых испытаний
4. Этап Опытная эксплуатация (подготовка к запуску) (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	16,5 дней	266 000,00р.	Необходимость данного этапа будет выявлена после этапа "Моделирования" при наличии функциональных разрывов с типовыми механизмами	Протоколы тестовых испытаний
5. Этап Внедрение (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	46,5 дней	663 000,00р.	Оплата за фактически отработанное время согласно Листам учета рабочего времени	Листы учета рабочего времени (ЛУРВ)

Номер в структуре	Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. без НДС	Ответственный	Ограничения
1	Управленческий контур (финансовый учет)		2 973 000,00р.		
1.1	ВНИИР, ФГБУ: Финансовый учет	113,5 дней	2 973 000,00р.		
1.1.1	Моделирование бизнес-процессов (анализ функциональных разрывов)	42 дней	728 000,00р.		
1.1.1.1	Подготовка функционального моделирования	15 дней	280 000,00р.		
1.1.1.1.1	Согласование графика интервью			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для Заказчика
1.1.1.1.2	Подготовка и согласование схемы финансового учета			Исполнитель	
1.1.1.1.3	Подготовка и согласование схемы аналитических разрезов на счетах бухгалтерского учета			Исполнитель	
1.1.1.1.4	Согласование перечня необходимых корректировок нормативно-справочной информации; первоначального заполнения нормативно-справочной информации			Исполнитель	
1.1.1.1.5	Подготовка и согласование реестра бизнес-процессов, реестра необходимых отчетов и примеров для моделирования (краткие интервью с пользователями - 20 человек); составление реестра пользователей и их прав			Исполнитель	
1.1.1.1.6	Уточнение схемы финансового учета (при необходимости)			Исполнитель	
1.1.1.1.7	Уточнение алгоритма учета заработной платы по темам			Исполнитель	
1.1.1.1.8	Подготовка базы для моделирования, установка релиза БИТ:УФГУ (БИТ:Управление финансами государственного учреждения); настройка пользователей и их прав			Исполнитель	моделирование в части аналитики бухгалтерского учета проводится на тестовой базе; в части финансового учета - можно проводить на рабочей
1.1.1.1.9	Настройка функциональных опций финансового учета для работы по требуемым бизнес-процессам в тестовой базе			Исполнитель	
1.1.1.1.10	Настройка аналитических разрезов на счетах бухгалтерского учета, настройка бухгалтерских операций			Исполнитель	
1.1.1.1.11	Подготовка в базе примеров для моделирования, загрузка данных ключевых справочников (при необходимости)			Исполнитель	

Номер в структуре	Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. без НДС	Ответственный	Ограничения
1.1.1.2	Функциональное моделирование (ввод контрольных примеров в программу, оформление протоколов интервью)	18,5 дней	266 000,00р.		
1.1.1.2.1	Ввод бюджетов			Исполнитель	
1.1.1.2.2	Ввод резервирования денежных средств (расход, при необходимости - доход)			Исполнитель	
1.1.1.2.3	Ввод договоров (расходы, с учетом графиков платежей и начислений)			Исполнитель	
1.1.1.2.4	Ввод договоров (доходы, с учетом графиков платежей и начислений)			Исполнитель	
1.1.1.2.5	Ввод счетов (доходы)			Исполнитель	
1.1.1.2.6	Ввод счетов (расходы), формирование платежного календаря			Исполнитель	
1.1.1.2.7	Заработная плата - учет начисления по темам			Исполнитель	
1.1.1.2.8	Ручное заполнение аналитик в бухгалтерских документах			Исполнитель	
1.1.1.2.9	Согласование алгоритма трансляции бухгалтерских данных			Исполнитель	
1.1.1.2.10	Заполнение бухгалтерской аналитики, распределение затрат, закрытие периода			Исполнитель	
1.1.1.2.11	Формирование отчетов			Исполнитель	
1.1.1.2.12	Демонстрация для ответственных по типовым возможностям			Исполнитель	
1.1.1.3	Анализ и протоколирование	5,5 дней	98 000,00р.		
1.1.1.3.1	Анализ замечаний, составление реестра функциональных разрывов и регистрация приоритетов по разрывам на критические доработки			Исполнитель	
1.1.1.3.2	Составление альбома печатных форм и отчетов			Исполнитель	
1.1.1.3.3	Согласование реестра функциональных разрывов, альбома печатных форм и отчетов			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для заказчика
1.1.1.3.4	Корректировки итогового результата по замечаниям Заказчика			Исполнитель	
1.1.1.4	Управление проектом			Исполнитель	
1.1.1.5	Подписание закрывающих документов			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для заказчика

Номер в структуре	Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. без НДС	Ответственный	Ограничения
1.1.2	Проектирование (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	7,5 дней	112 000,00р.		
1.1.2.1	Составление листов требований по интеграции с заработной платой			Исполнитель	
1.1.2.2	Составление листов требований по алгоритму трансляции бухгалтерских данных			Исполнитель	
1.1.2.3	Составление листов требований по переносу и корректировке данных			Исполнитель	
1.1.2.4	Составление листов требований по функциональным разрывам (делается одновременно с моделированием)			Исполнитель	
1.1.2.5	Согласование листов требований заказчиком			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для заказчика
1.1.2.6	Корректировки итогового результата			Исполнитель	
1.1.2.7	Управление проектом			Исполнитель	
1.1.2.8	Подписание закрывающих документов			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для заказчика
1.1.3	Разработка по листам требований (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	21 дней	1 204 000,00р.		
1.1.3.1	Реализация доработок по листам требований	11 дней	728 000,00р.		
1.1.3.1.1	Доработка связи аналитик, автозаполнения аналитик			Исполнитель	
1.1.3.1.2	Возможно потребуется доработка автоматического заполнения и корректировки графиков платежей и начислений по договорам по тем или иным алгоритмам			Исполнитель	
1.1.3.1.3	Возможно доработка заполнения / печати / контроля платежного календаря.			Исполнитель	
1.1.3.1.4	Доработка дополнительных отчетов (как правило, требуется, есть нестандартные отчетные формы)			Исполнитель	
1.1.3.1.5	Доработка учета дебиторской / кредиторской задолженности в разрезе аналитик финансового учета			Исполнитель	
1.1.3.1.6	Доработка распределения заработной платы по темам			Исполнитель	
1.1.3.1.7	Доработка печатных форм			Исполнитель	
1.1.3.1.8	Разработка дополнительных отчетов			Исполнитель	
1.1.3.1.9	Другие возможные доработки по результатам моделирования			Исполнитель	
1.1.3.1.10	Разработка и тестирование обмена данными с Подсистемой Зарплата (зарплата по темам, ЦФО, Подразделениям)			Исполнитель	
1.1.3.1.11	Функциональное тестирование доработок			Исполнитель	

Номер в структуре	Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. без НДС	Ответственный	Ограничения
1.1.3.2	Доработка первоначального импорта данных	6 дней	168 000,00р.		
1.1.3.2.1	Корректировка справочной информации с помощью обработок			Исполнитель	
1.1.3.2.2	Загрузка / корректировка данных по договорам			Исполнитель	
1.1.3.2.3	Загрузка справочной информации			Исполнитель	
1.1.3.2.4	Загрузка остатков по таблицам, предоставленным Заказчиком			Исполнитель	
1.1.3.3	Сдача работ	4 дней	168 000,00р.	Исполнитель	
1.1.3.3.1	Сдача доработок по ЛТ по протоколам тестирования			Исполнитель	
1.1.3.3.2	Создание операционных инструкций для пользователей по доработанной функциональности (при необходимости)			Исполнитель	Возможно уменьшение либо вместо инструкции достаточно будет видео с тренинга пользователей
1.1.3.4	Управление проектом			Исполнитель	
1.1.3.5	Согласование протоколов тестирования Заказчиком и подписание закрывающих документов			<ЗАКАЗЧИК>	Срок для заказчика
1.1.4	Опытная эксплуатация (подготовка к запуску) (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	16,5 дней	266 000,00р.		
1.1.4.1	Составление плана тренинга			Исполнитель	
1.1.4.2	Тренинг для пользователей по функциональным возможностям программы (11 человек)			Исполнитель	
1.1.4.3	Доработка пользовательской инструкции по результатам тренинга (при необходимости)			Исполнитель	
1.1.4.4	Первый тест доработанной функциональности с ключевыми пользователями			Исполнитель	
1.1.4.5	Корректировки по результатам тестирования			Исполнитель	
1.1.4.6	Второй тест доработанной функциональности с пользователями			Исполнитель	
1.1.4.7	Корректировки итогового результата и составление протокола о готовности запуска в эксплуатацию			Исполнитель	
1.1.4.8	Управление проектом			Исполнитель	
1.1.4.9	Сдача системы по протоколам тестирования и подписание закрывающих документов			Исполнитель	

Номер в структуре	Название задачи	Длительность, раб. Дни	Стоимость, руб. без НДС	Ответственный	Ограничения
1.1.5	Внедрение (статистическая прогнозная оценка - окончательная оценка по итогам моделирования)	26,5 дней	663 000,00р.		
1.1.5.1	Настройка системы и ввод в эксплуатацию	6,5 дней	175 000,00р.		
1.1.5.1.1	Настройка конфигурации (установка значений настроек конфигурации).			Исполнитель	
1.1.5.1.2	Итоговый перенос нормативно-справочной информации и остатков			Исполнитель	
1.1.5.1.3	Выверка начальных данных и остатков			Исполнитель	
1.1.5.1.4	Выверка начальных данных и остатков			<ЗАКАЗЧИК>	
1.1.5.1.5	Корректировка данных по результатам сверки			Исполнитель	
1.1.5.1.6	Управление проектом			Исполнитель	
1.1.5.1.7	Сдача системы по протоколам тестирования и подписание закрывающих документов			Исполнитель	
1.1.5.2	Ввод в эксплуатацию	20 дней?	488 000,00р.		
1.1.5.2.1	Сопровождение запуска в течение 3-х месяцев: поддержка на промышленной эксплуатации системы - любые текущие вопросы, дополнительные доработки (1,5 дня в неделю, по договору сопровождения)			Исполнитель	
1.1.5.2.2	Управление проектом			Исполнитель	

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

- ❑ В стоимость выполнения проекта не включена стоимость клиентских лицензий 1С:Предприятие». Клиентские лицензии «1С:Предприятие» приобретаются по отдельному Сублицензионному договору.
- ❑ Проект осуществляется в удаленном формате: встречи проводятся преимущественно по ВКС (видеоконференцсвязи). Также Заказчик предоставляет удаленный доступ к рабочей базе для настроек.
- ❑ Дополнительно ограничения по конкретным этапам приведены в Приложении к данному КП.

Программный Продукт

БИТ.Управление финансами государственного учреждения. Поставка на 5 рабочих мест



Планирование и контроль финансовых средств и денежных потоков



Оперативное получение данных об исполнении плановых показателей



11 типовых аналитических разрезов + 20 дополнительных произвольного типа



Планирование доходов и расходов по договорам и иным основаниям возникновения обязательств



Работа в единых справочниках, исключение дублирования информации



Гибкие механизмы настройки управленческой отчетности

Стоимость: 95 000 рублей

Руководитель проекта



Гребеножко Наталия

Руководитель бюджетной группы
Компания «Первый БИТ»

Почта: NGrebenozhko@1cbit.ru

Телефон: +7 (965) 357-51-73

Менеджер проекта



Гусев Александр

Менеджер по работе с ключевыми клиентами
Компания «Первый БИТ»

Почта: ALVGusev@1cbit.ru

Телефон: +7 (929) 570-86-72

