


03-04.02.2021г.

Риски проекта

урок 35-36



Просмотр видеосюжета № 1

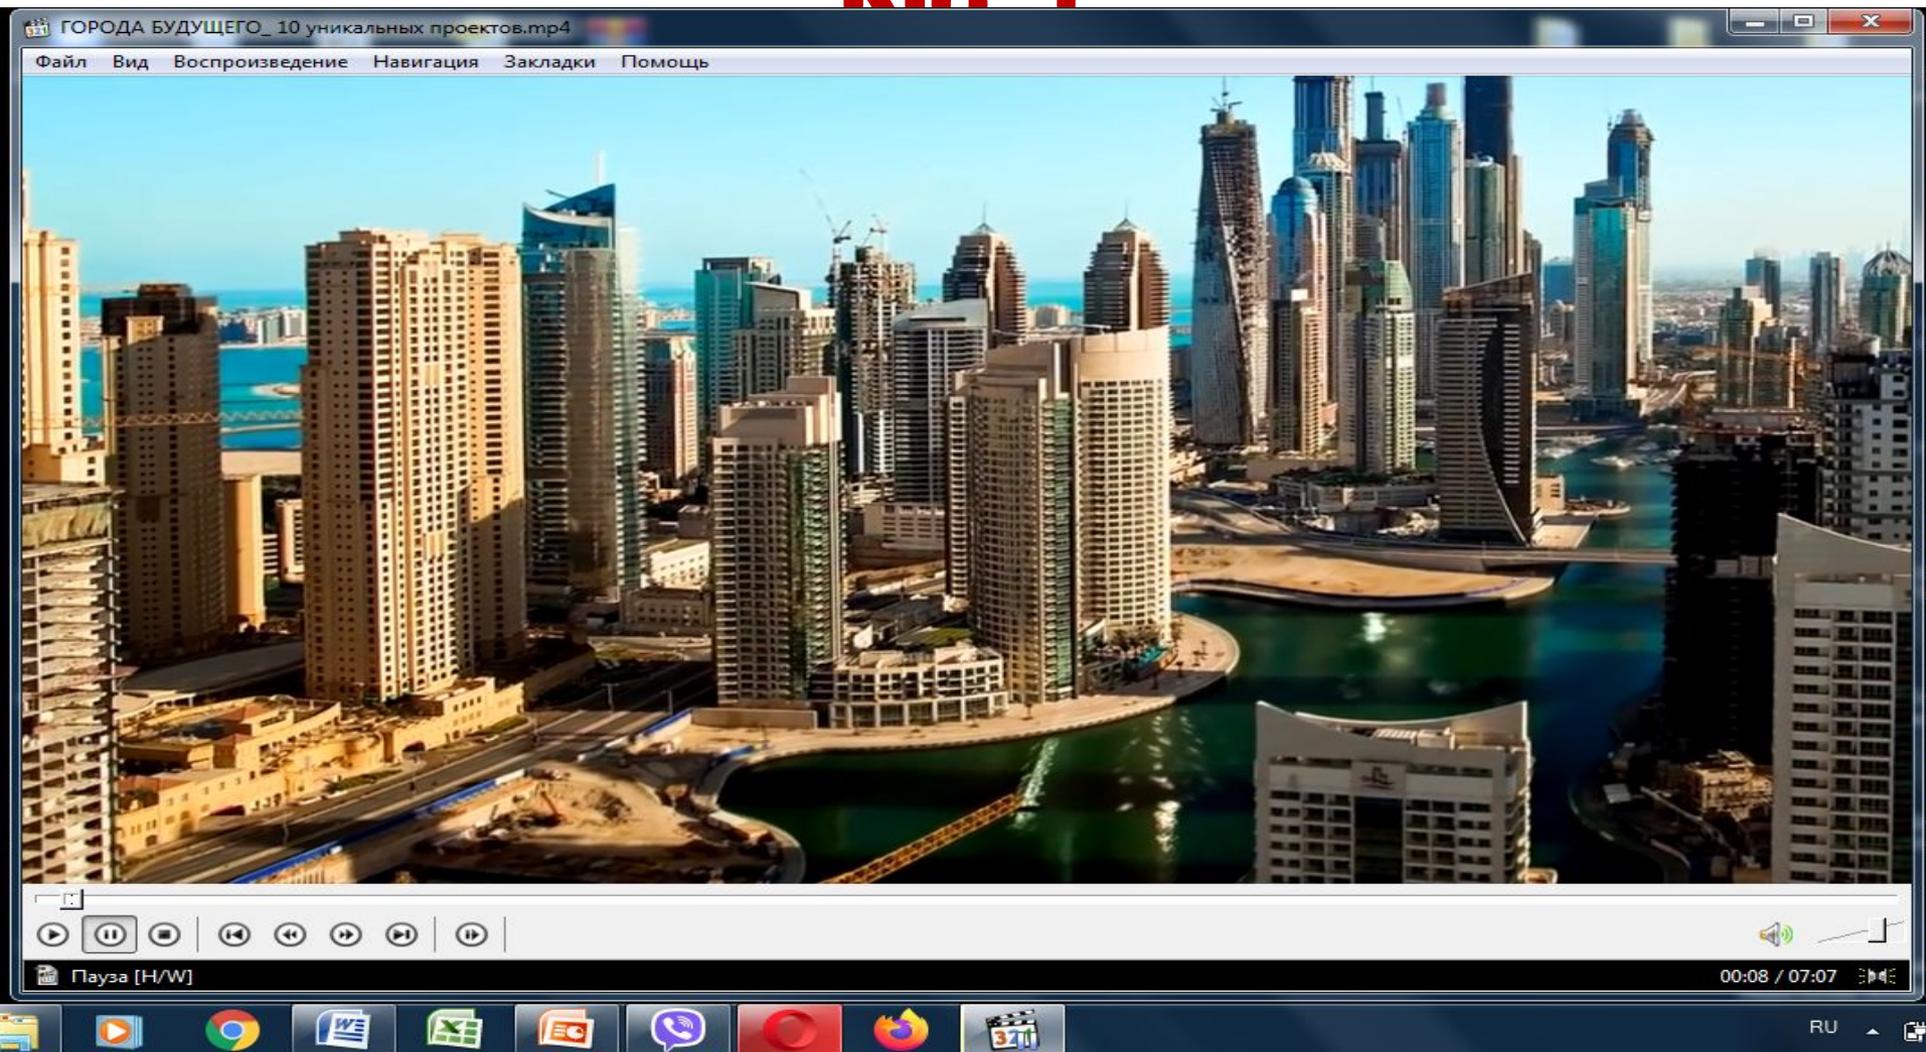

В чем перспектива таких
проектов?

Просмотр видеосюжета

№ 2

«Умный» город будущего, в котором никто не живет_ как провалился самый амбициозный проект

Файл Вид Воспроизведение Навигация Закладки Помощь



В 2002 году в 25 километрах от Сеула началось строительство Сондо (SongDo) — города будущего, который должен был перевернуть представление зажиточных жителей столицы Южной Кореи о жизни в современном мегаполисе.

100%



проекта?

Риски проекта

Риск – деятельность в ситуации неопределенности, когда есть возможность определить вероятность наступления того или иного события (исхода)

Риск проекта - ситуация, следствием которой является:

- задержки выполнения запланированных мероприятий
- появление дополнительных затрат
- снижение качества проекта
- или другие события, влияющие на достижение целей проекта

№	ФАКТОРЫ РИСКА	ВИДЫ РИСКА
1	ФИНАНСОВЫЕ	НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ВАЛЮТ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ	АВАРИИ, ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ НЕВЕРНЫЕ ПРОГНОЗЫ (глубина залегания, объемы прибыльной нефти)
3	РИСКИ УЧАСТНИКОВ	РИСКИ ИНВЕСТОРА РИСКИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
4	СТРАНОВЫЕ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ, ЯЗЫКОВЫЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
5	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НИЩЕТА, ИНФЛЯЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
6	СОЦИАЛЬНЫЕ	ЗАБАСТОВКИ, САБОТАЖ ТЕРРОРИЗМ
7	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БЕДСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ
8	НОРМАТИВНО- ЗАКОНАДАТЕЛЬНЫЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ)	ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПОРТА, ИМПОРТА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
9	МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НЕОЖИДАННЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Внешние факторы

Финансовые риски

Процентные ставки
Курсы валют
Обязательства по кредиту

Стратегические риски

Конкуренция
Изменения потребительского рынка
Отраслевые изменения

Внутренние факторы

Ликвидные средства
Денежный поток
Исследования и развитие
Интеллектуальный капитал

Компания

Бухучет
Информационные технологии
Персонал
Имущество
Продукты и услуги

Операционные риски

Поставка сырья
Набор кадров

Опасности

Договоры
Естественные опасности
Поставщики
Окружающая среда

Пример минимизация потерь проекта

Риски проекта	Как минимизировать
<p><u>Риски реализации:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Не уложиться в поставленные сроки реализации проекта2. Отказ/нежелание администрации сотрудничать с нами3. Задержка в доставке оборудования	<ul style="list-style-type: none">• Четко разработать план проект, контролировать исполнение• Эффективно распределить обязанности среди исполнителей проекта• Иметь письменную договоренность об обязательствах, юридически подтвержденную
<p><u>Риски эксплуатации:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Нехватка сырьевых ресурсов2. Производство некачественной продукции3. Перебои в поставке продукции	<ul style="list-style-type: none">• Искать дополнительные источники• Заключение резервный договор с заводом по производству пластика• Приобрести ТУ на изготовление продукции• Работать с проверенными и

Задание в классе:

Выберите тему проекта по направлениям:

1. Посадим дерево-.....!
2. Разместим кормушку в холода-.....!
3. Собираем батарейки -!
4. Пластиковые крышки не выбрасывай-!



5. Копим монеты...

По шаблону таблицы 1 (стр.86-87)

ответьте на вопросы:

1. Цель

2. Основной способ достижения цели

3. Задействованные ресурсы и их применение

4. Риски, их вероятность и способы противодействия

5. Результат



Работа в группах по представлению и анализу проектов учащихся



Домашнее задание:

1. Параграф 5.2 (стр.84-88) учебного пособия
2. Задание в классе по группам
3. Подготовиться к защите проектов и оценке работ конкурентов
