


История управления проектами в Советском Союзе

Муромский мост через р. Ока (1912 г.)



Фот. № 7 Общій видъ моста черезъ р. Оку у гор. Муромъ.

7/виі 1912 г.

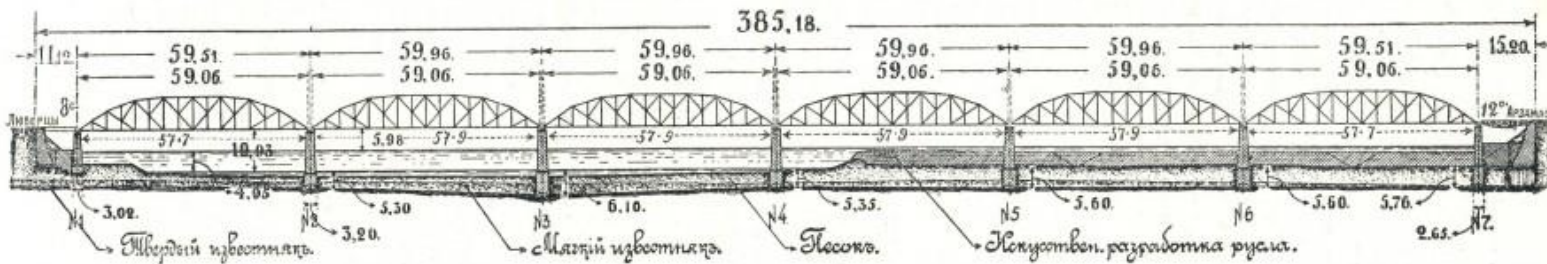

Черт. № 8 Схема моста съ геологическимъ разрѣзомъ.

Муромский мост через р. Ока (1912 г.)



фот. № 64. Открытие моста 2 сентября 1912 года.

«Тектология» А.А. Богданова




НЭП



Поточные методы строительства




Поточные методы строительства

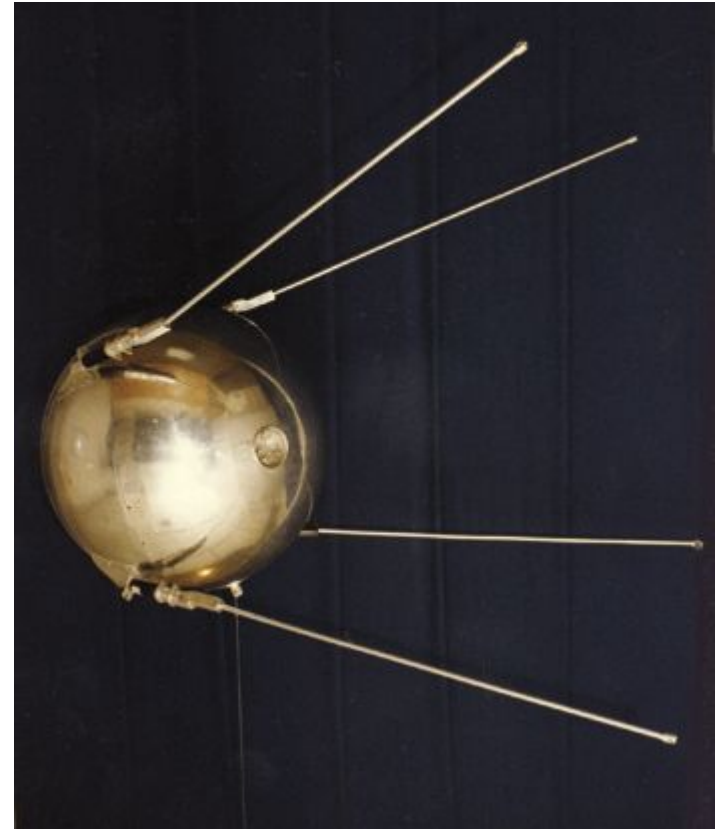

Сетевые методы УП в СССР

Управление производственными процессами 1930-1960			
Методы	Приложения	Авторы	Публикации
Диаграммы Ганта	Гражданское строительство	М.В. Вавилов	1930
Потоки	Единичное производство	В.И. Батурин	1949
Циклограммы	Мелкосерийное производство	М.С. Будников, В.И. Рыбальский	1961

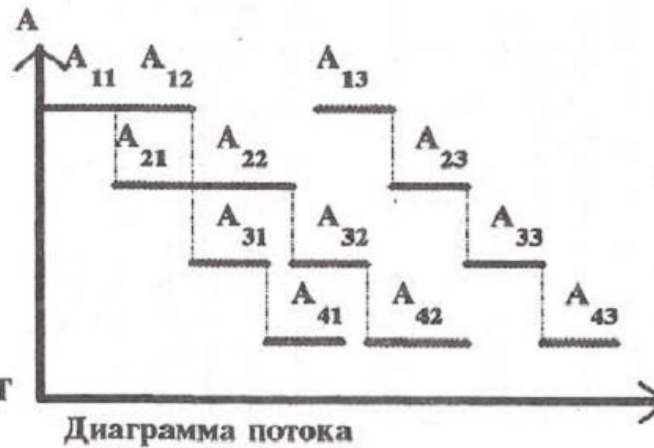

Развитие сетевых моделей УП в СССР

СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ			
Методы	Приложения	Авторы в СССР	Публикации
<p>Критического пути</p> <p>PERT</p> <p>Многопроектные сети</p>	<p>Управление проектами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленными - строительными - исследовательскими ● Временной анализ ● Стоимостной анализ ● Анализ ресурсов ● Распределение ресурсов 	<p>Г.С. Поспелов</p> <p>А.И. Тейман</p> <p>Ю.А. Авдеев</p> <p>В.Н. Бурков</p> <p>С.И. Зуховицкий</p> <p>И.А. Радчик</p>	<p>1963</p> <p>1963</p> <p>1965</p> <p>1965</p>
<p>Стохастические сети</p> <p>Альтернативные сети</p>	<p>Анализ рисков/надежности проектов</p> <p>Анализ альтернатив для исследовательских проектов</p>	<p>Д.И. Голенко</p> <p>С.Е. Лившиц</p> <p>К.А. Ангонавичус</p>	<p>1968</p> <p>1971</p> <p>1971</p>
<p>Обобщенные сети</p>	<p>Временной, стоимостной и ресурсный анализ; распределение ресурсов в сложных проектах</p>	<p>Г.М. Адельсон-Вельский</p> <p>В.И. Воропаев</p> <p>С.С. Калиновская</p> <p>М.В. Шейнберг</p>	<p>1971 -</p> <p>1974</p>

Концептуальная схема управления проектами

